

De eerste fase van de bouw is opgeleverd. In de helft van de vleugel gaat het op warme dagen nog niet helemaal goed met het klimaat, maar we zijn bezig te onderzoeken waar dit aan ligt zodat het opgelost kan worden. De verf op de trapeuningen heeft niet goed gehecht, dus dat wordt binnenkort overgedaan op een moment dat de school gesloten is. Ook de blauwe panelen op de begane grond zijn nog niet gereed, en laten we verspreid over de zaterdagen uitvoeren zodat er geen overlast voor de lessen van is. Dit zijn de grootste punten. Hoewel er daarnaast ook nog kleinere opleverpunten zijn, is het een schitterende vleugel geworden.

Fase 2A was natuurlijk al aan de gang sinds de meivakantie. Daar is nu fase 2B bij gekomen, de eerste en tweede verdieping van de 40-vleugel. Aangezien de 40-vleugel minder rigoreus wordt aangepakt dan de andere vleugels, is hier minder tijd voor nodig. De sloop duurt daar korter, en na sloop zitten we bijna direct in afbouw, zonder dat er echt veel ruwbouw is. In die zin zitten we echt in twee verschillende fases; in het centrale deel van de school zit men volop in de ruwbouw, maar in de 40-vleugel zijn sloopwerkzaamheden in volle gang. Dit laatste is uiteraard goed te horen, vooral op de begane grond zal daar overlast zijn. In het centrale deel zijn ze nu met het metselwerk van de buitengevels bezig en worden binnenkort de gevels geplaatst. Als het goed is komen fase 2A en 2B straks tegelijk in de afbouwfase, en worden deze samen voor kerst opgeleverd. De bedoeling is dat in de kerstvakantie de verhuizing plaatsvindt, en we de laatste fase overhandigen aan de bouw. Dat is de volledige 30-vleugel en de begane grond van de 40-vleugel.

Ook wordt er op dit moment in de aula en de entree gewerkt. We hebben hier de volgende afspraken over gemaakt:


- Het deel in de aula wat nu in de bouwhekken staat is in de herfstvakantie gereed.
- Het overige deel van de aula wordt als 1 project in de zomervakantie van 2025/2026 uitgevoerd.
- De entree gaan we in delen uitvoeren terwijl we geopend zijn. Het doel hiervan is dat dit gereed is met de informatieavonden.
- De vloer is er vandaag deels uit gegaan, ter plaatse van de staalconstructie.
- Begin komende week wordt dit geëgaliseerd.
- De rest van de vloer gaat er in de herfstvakantie uit en wordt geëgaliseerd, behalve rond het stofschoot.
- De vloer wordt in delen gelegd tijdens schooltijd na de herfstvakantie.
- Schilderwerk en bekleden van de kolommen en staalconstructie gebeurt tijdens schooltijd, voor en na de herfstvakantie.
- Plafonds aanbrengen na de herfstvakantie tijdens schooltijd.
- Laatste stuk afwerking waar nu nog stofschoot staat gebeurt in week 1.

Zoals hierboven te zien gebeurt er een hoop tijdens schooltijd. Hier zal telkens een klein werkgebied voor afgezet worden. Er zal vanaf nu tot aan kerst dus nog een hoop gebeuren waar we wat hinder van ondervinden, maar vanaf dan gaan we naar de laatste fase van de bouw. Hieronder zoals altijd een paar sfeerimpressies.

A solid red triangle is located in the bottom right corner of the page.



1^{ste} verdieping gang centrale deel school

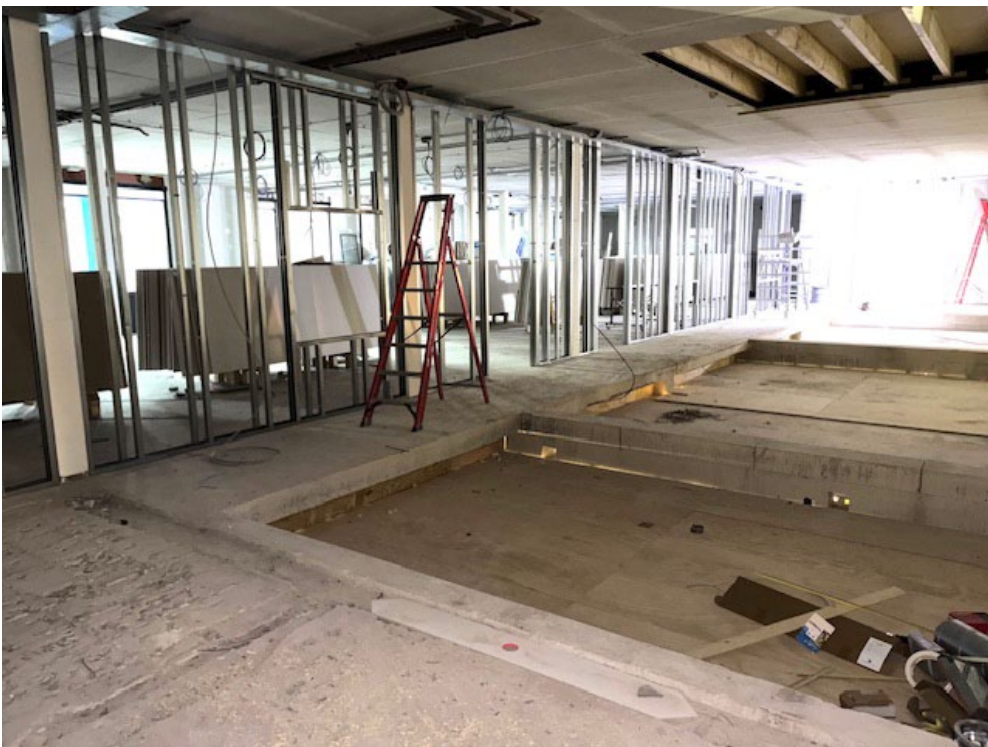

1^{ste} verdieping gang rond vide bij nieuwe toetslokalen, vroeger mediatheek




1ste verdieping gang 40-vleugel



Personeelskamer en L145/L146 is nu tijdelijk 1 grote open ruimte



Nieuwe, grotere toiletblokken voor het personeel, waar de latten zitten wordt een deuropening gezaagd.

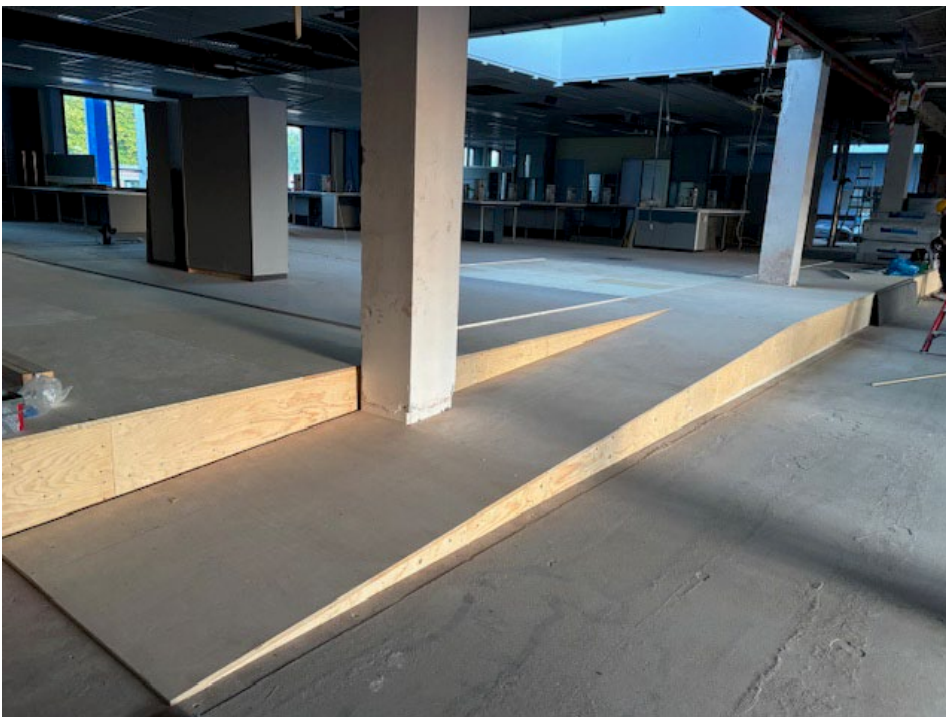

Science-floor is ook open, nieuwe hellingbaan is gemaakt.



Metselwerk gevel 20-gang is al ver klaar, hierna volgt de glazen pui.



Dak 20-gang is gereed.
